


### Grafic lucrari finalizate apa Bicz

	Denumire obiectiv	Realizat	Tinta
1	Str. Pietei	100,00%	0,00%
2	Str. Codrului	100,00%	0,00%
3	Str. Vanatorilor	100,00%	0,00%
4	Str. Dimitrie Leonida	100,00%	0,00%
5	Str. Primaverii	100,00%	0,00%
6	Str. Paraul Basei	100,00%	0,00%

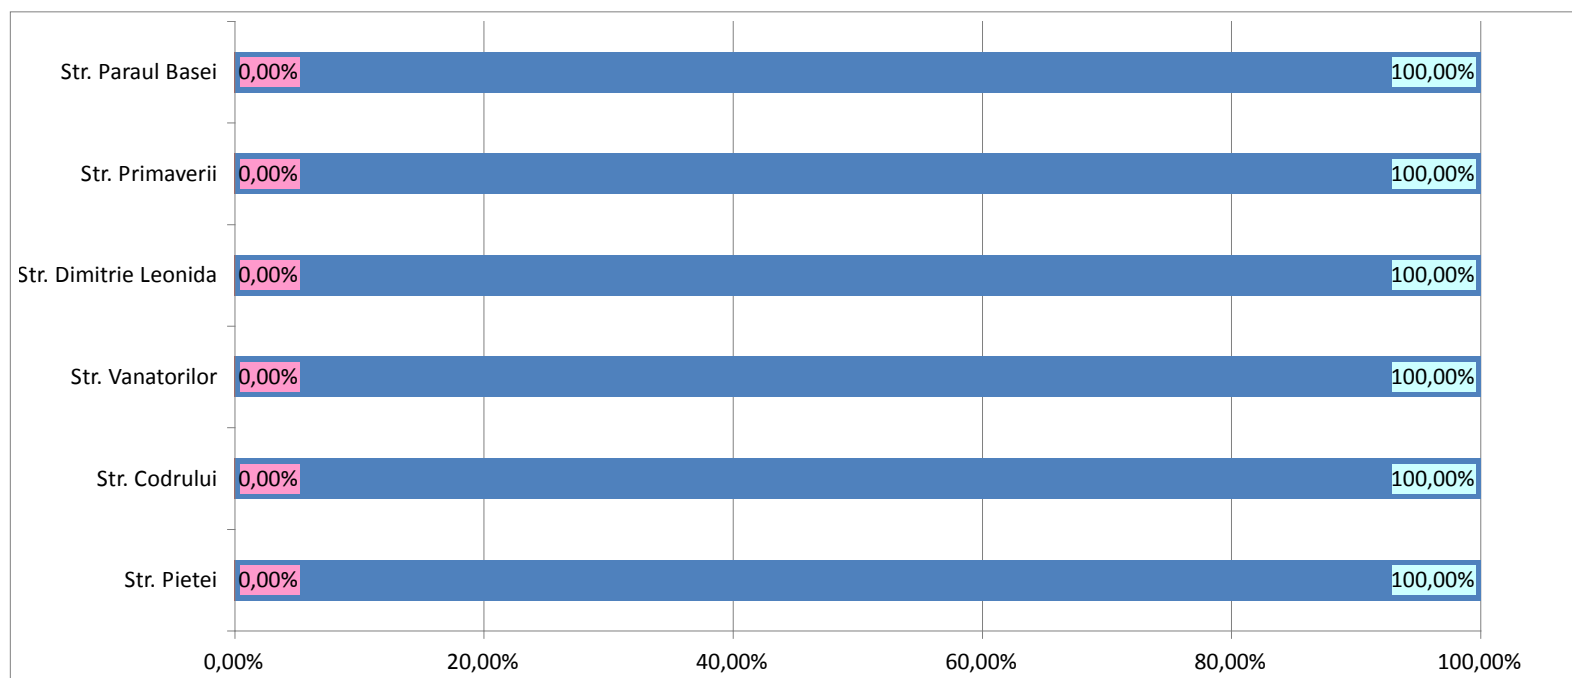

**Grafic lucrari finalizate  
canalizare Bicz**

	<b>Denumire obiectiv</b>	<b>Realizat</b>	<b>Tinta</b>
1	Str. Cojusna	100,00%	0,00%
2	Str. Muncii	100,00%	0,00%
3	Str. Uzinei	100,00%	0,00%
4	Str. Paraul Basei	100,00%	0,00%
5	Str. Paltinului	100,00%	0,00%
6	Str. Bistritei	100,00%	0,00%
7	Str. Capsa	100,00%	0,00%
8	Str. Mioritei	100,00%	0,00%
9	Str. Dumbravei	100,00%	0,00%
10	Str. Aleea Dorului	100,00%	0,00%
11	Str. Aleea Florilor	100,00%	0,00%
12	Str. Codrului	100,00%	0,00%
13	Str. Crasnitei	100,00%	0,00%
14	Str. Republicii	100,00%	0,00%
15	Str. Pacii	100,00%	0,00%
16	Str. Stadionului	100,00%	0,00%
17	Str. Brazilor	100,00%	0,00%
18	Str. Carbuna	100,00%	0,00%
19	Str. Marcenii	100,00%	0,00%
20	Str. Dimitrie Leonida	100,00%	0,00%
21	Str. Vanatorilor	100,00%	0,00%
22	Str. Primaverii	100,00%	0,00%
23	Str. Stejarilor	100,00%	0,00%
24	Str. Plutasului	100,00%	0,00%
25	Str. Cozmitei	100,00%	0,00%
26	Str. Zimbrului	100,00%	0,00%
27	Str. Plaiului	100,00%	0,00%
28	Str. Ghiocelului	100,00%	0,00%
29	Str. 22 Decembrie	100,00%	0,00%
30	Str. Barajului	100,00%	0,00%
31	Str. Subtraversare rau Bicz	100,00%	0,00%

### Grafic lucrari finalizate canalizare Bicz

